# TQ.21.00.00.02 Machbarkeit Projektdefinition

## Prozessverantwortliche

| Zuständigkeit | Funktion / Person | Signatur |
|---|---|---|
| Eigner | Daniel Züger, Leiter Immobilienmanagement | |
| Freigabe | 21.12.2023 / Dorothy Holt Wacker | |
| Verantwortlich | Dorothy Holt Wacker, Leiterin Programm- und Projektentwicklung | |

## Zweck / Bemerkungen

Dieser Prozess regelt den Ablauf bei A- und B-Geschäften vom Auftrag „Machbarkeit / Projektdefinition“, über den Entscheid Eintreten auf das Projekt bis zum durch den Antragsteller bestätigten Projektauftrag. Ziel ist insbesondere die Prüfung der Machbarkeit inkl. Grobkostenermittlung entscheidorientierter Terminplan sowie die Erstellung der Projektdefinition.

## Grundlagen

- Gesetze, Verordnungen und politische Vorgaben
- Verordnung über das Immobilienmanagement und die Logistik des Bundes (VILB)
- Weisungen EFD
- Weisung über wirtschaftliche Nutzung und den Betrieb der Bauten im BBL-Immobilienportfolio
- Strategische Konzepte Vorgaben (Portfoliostrategie, UK, BWEK)
- Masterpläne und Nutzerkonzepte Benutzerorganisationen
- Anträge von Benutzerorganisationen
- Aufträge PFM

## Prozess-Diagramm

## Status

RROZBBL-82 - Jira issue doesn't exist or you don't have permission to view it.

## Inhalt


- Prozessverantwortliche
- Zweck / Bemerkungen
- Grundlagen
- Status
- Relevante Dokumente
- Prozess-Diagramm
- Prozessschritte
- Beziehungen zu anderen Prozessen
- Änderungsverzeichnis


## Relevante Dokumente

- TQ.21.00.00.02 Machbarkeit / Projektdefinition (060-5/4/1/1)
- TQ.21.04.04.04 Steuerung BUD Bauprojekte aus Globalbudget Investitionen (060-5/4/4/3)
- TQ.21.00.00.45 Bewirtschaftung von Vermietungen, Verpachtungen, Baurechtsvergaben (060-5/4/1/9)

## Kontakt

Benutzer 'U80804386' nicht gefunden

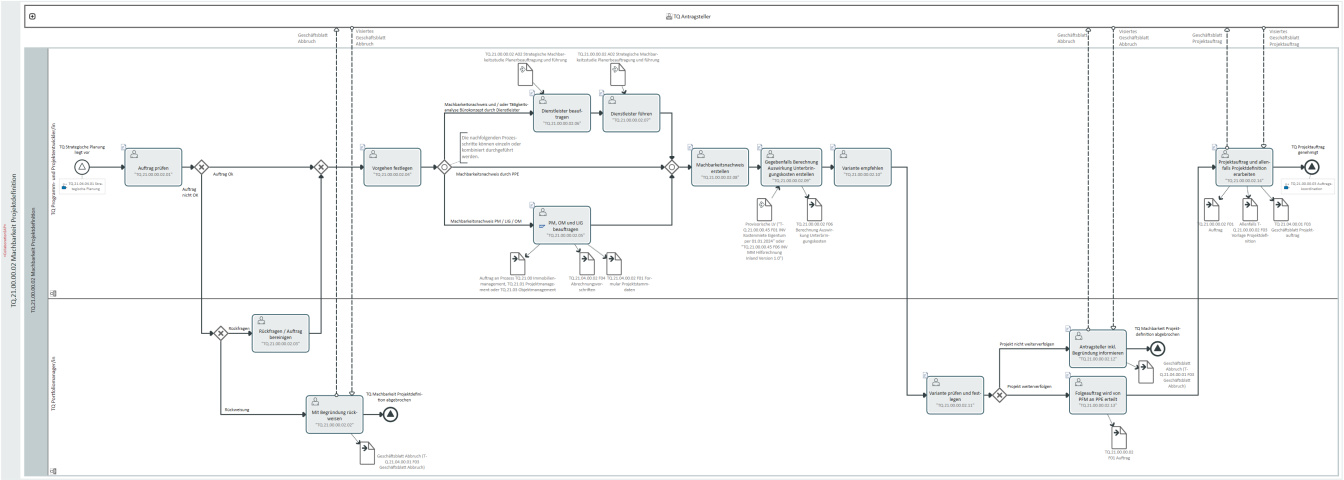


# Prozessschritte

| Name | ID-composed | beeinflusst durch Risiko | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Auftrag prüfen | TQ. 21.00.00.02.01 | | Überprüfen der Unterlagen auf Vollständigkeit und Verständlichkeit (Geschäftsblatt 1, bereinigtes Bedürfnis muss vorliegen)<br>Info an PFM |
| Mit Begründung rückweisen | TQ. 21.00.00.02.02 | | |
| Rückfragen / Auftrag bereinigen | TQ. 21.00.00.02.03 | | |
| Vorgehen festlegen | TQ. 21.00.00.02.04 | | Ausland-Geschäfte: Bei komplexen Vorhaben oder Vorhaben der Grössenordnung > 10.0 Mio. CHF Notwendigkeit einer Dienstreise klären.<br>Beibezug und Info an PFM, PM, LIG und BO. |
| PM, OM und LIG beauftragen | TQ. 21.00.00.02.05 | | TQ.21.00.00.02 F01 Auftrag Anhang 1 (TQ.21.00 Immobilienmanagement (K0), TQ.21.01 Projektmanagement (K1), TQ.21.03 Objektmanagement (K3))<br>TQ.21.04.00.02 F04 Abrechnungsvorschriften<br>TQ.21.04.00.02 F01 Formular Projektstammdaten<br>Beibezug und Info an PM, OM und LIG<br>Claim erfassen, bzw. bewirtschaften<br>Ggf. Projektstatus auf "Auftrag erteilt" mutieren |
| Dienstleister beauftragen | TQ. 21.00.00.02.06 | | Arbeitsanleitung TQ.21.00.00.02 A02 Strategische Machbarkeitsstudie Planerbeauftragung und führung (Rahmenvertrag, Offerten, Vertrag, Finanzierung etc. Beizug von PM, OM, LIG und BO. Info an Planer |
| Dienstleister führen | TQ. 21.00.00.02.07 | | TQ.21.00.00.02 A02 Strategische Machbarkeitsstudie Planerbeauftragung und führung.<br>Bei Umsetzung Desksharing / neue Arbeitswelten: Tätigkeitsanalyse zwecks festlegen Sharing Ratio und Bürokonzept erstellen lassen |
| Machbarkeitsnachweis erstellen | TQ. 21.00.00.02.08 | | Nachweis Machbarkeit (bei komplexeren Bauprojekten gem. SIA112, Phase 21)<br>Grobkostenermittlung entscheidorientierter Terminplan |
| Gegebenfalls Berechnung Auswirkung Unterbringungskosten erstellen | TQ. 21.00.00.02.09 | | Input: Provisorische LV ("TQ.21.00.00.45 F01 INV Kostenmiete Eigentum per 01.01.2024" oder "TQ.21.00.00.45 F06 INV MM Hilfsrechnung Inland Version 1.0")<br>Ggf. Überprüfen Berechnung Auswirkung auf Unterbringungskosten und ggf. Beizug von PFM und der BO.<br>Output: TQ.21.00.00.02 F06 Berechnung Auswirkung Unterbringungskosten. |
| Variante empfehlen | TQ. 21.00.00.02.10 | | Prüfen und Beurteilen der Resultate / Machbarkeitsstudie und allfälliger Empfehlungen und Entscheidinstrumente. Variante empfehlen und Variantenentscheid PFM herbeiführen. |
| Variante prüfen und festlegen | TQ. 21.00.00.02.11 | | Variantenentscheid PFM herbeiführen. |
| Antragsteller inkl. Begründung informieren | TQ. 21.00.00.02.12 | | TQ.21.04.00.01 F03 Geschäftsblatt Abbruch |
| Folgeauftrag wird von PFM an PPE erteilt | TQ. 21.00.00.02.13 | | TQ.21.00.00.02 F01 Auftrag |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektauftrag und allenfalls Projektdefinition erarbeiten | TQ. 21.00.00.02.14 | | Allfällige zusätzliche Faktoren aus dem Projektentscheid prüfen und einfliessen lassen. Grundsätzlich bei komplexen Vorhaben oder Vorhaben > 10.0 Mio. CHF Projektdefinition verfassen (TQ.21.00.00.02 F03 Vorlage Projektdefinition)<br>Bei Bedarf mittels Geschäftsblatt die Projektziele durch den Antragsteller bestätigen lassen, TQ 21.04.00.01 F03 Geschäftsblatt Projektauftrag. Beizug der BO, Info an PFM. Unterschriftenregelung gemäss Vorgaben. |

# Abkürzungen und Begriffe

- BO = Benutzerorganisation
- BWEK = Bauwerkserhaltungskonzept
- LIG = Liegenschaften
- LV = Leistungsvereinbarung
- MBS = Machbarkeitsstudie
- OM = Objektmanagement
- PFM = Portfoliomanager/in
- PPE= Programm- und Projektenwickler/in
- PM = Projektmanagement
- UK = Unterbringungskonzept

# Beziehungen zu anderen Prozessen

| Informationen / Aktivitäten | Prozess |
|---|---|
| Projektinitialisierungsauftrag | aus Geschäftsprozess TQ.21.04 Portfoliomanagement |
| Auftrag | an Geschäftsprozesse TQ.21.00 Immobilienmanagement, TQ.21.01 Projektmanagement, TQ 21.03 Objektmanagement |
| Projektauftrag | an Geschäftsprozess TQ.21.00.00.03 Auftragskoordination |

# Änderungsverzeichnis

| Version | Veröffentlicht | Geändert von | Kommentar |
|---|---|---|---|
| **AKTUELL (v. 86)** | **21.12.2023 09:16** | Portmann Thomas BBL | |
| v. 85 | 20.12.2023 15:36 | Portmann Thomas BBL | |
| v. 84 | 20.12.2023 15:32 | Künzli Rolf BBL | |
| v. 83 | 20.12.2023 15:30 | Künzli Rolf BBL | |
| v. 82 | 20.12.2023 14:36 | Portmann Thomas BBL | zurückgeholt von v. 78 |

Zum Seitenverlauf wechseln
