TQ.21.00.00.03 Auftragskoordination

Prozessverantwortliche

Zuständigkeit	Funktion / Person	Signatur
Eigner	Daniel Züger, Leiter Immobilienmanagement	
Freigabe	18.12.2023 / Dorothy Holt Wacker	
Verantwortlich	Dorothy Holt Wacker, Leiterin Programm- und Projektentwicklung	

Zweck / Bemerkungen

Dieser Prozess dient der korrekten Koordination und Überwachung von A- und B-Geschäften nach erfolgter Auftragserteilung bis zum Debriefing des jeweiligen Geschäfts.

Grundlagen

Auftrag aus Prozess TQ.21.00.00.02 Machbarkeit / Projektdefinition (060-5/4/1/1)

Status

RROZBBL-83 - Jira issue doesn't exist or you don't have permission to view it.

Inhalt

- Prozessverantwortliche
- Zweck / Bemerkungen
- Grundlagen
- Status
- Relevante Dokumente
- Prozess-Diagramm
- Prozessschritte
- Beziehungen zu anderen Prozessen
- Änderungsverzeichnis

Relevante Dokumente

- TQ.21.00.00.03 Auftragskoordination (060-5/4/1/2)
- TQ.21.00.00.02 Machbarkeit / Projektdefinition (060-5/4/1/1)

Kontakt

Benutzer 'U80804386' nicht gefunden

Prozess-Diagramm

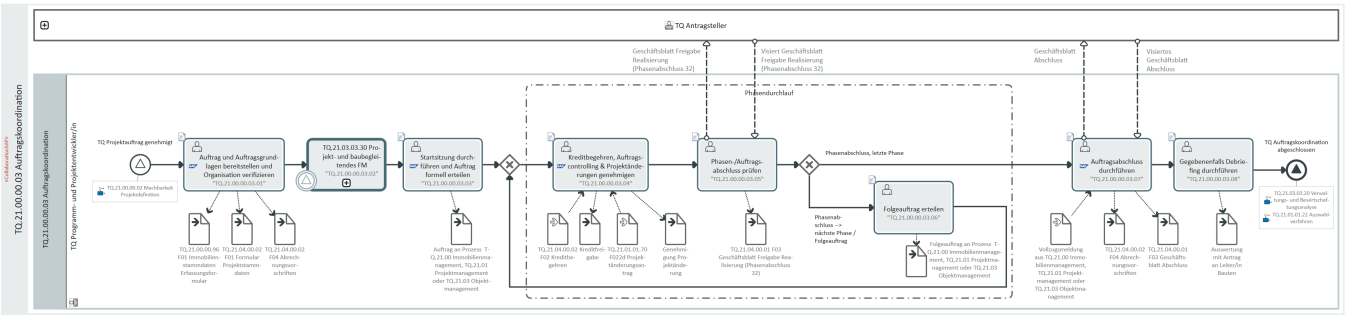

Prozessschritte

Name	ID-composed	beeinflusst durch Risiko	Beschreibung

Auftrag und Auftragsgrundlagen bereitstellen und Organisation verifizieren	TQ. 21.00.00.03.01		- Auftrag und Auftragsgrundlagen bereitstellen und Organisation sowie Verteiler verifizieren - Stammdaten und Abrechnungsvorschriften überprüfen ggfs. anpassen - Unklarheiten, Differenzen bereinigen und Auftrag entsprechend anpassen. Output: - TQ.21.00.00.96 F01 Immobilienstammdaten Erfassungsformular - TQ.21.04.00.02 F01 Formular Projektstammdaten - TQ.21.04.00.02 F04 Abrechnungsvorschriften
TQ.21.03.03.30 Projekt- und baubegleitendes FM	TQ. 21.00.00.03.02		
Startsitzung durchführen und Auftrag formell erteilen	TQ. 21.00.00.03.03		- Alle Projektbeteiligten einladen - Auftragsinhalte absprechen - Auftrag finalisieren und schriftlich erteilen - Claim erfassen, bzw. anpassen - Projektstatus im SAP ggf. auf "in Auftrag" mutieren Ausgelöste Prozesse siehe TQ.21.00.00.02 F01 Auftrag Anhang 1 (TQ.21.00 Immobilienmanagement (K0), TQ.21.01 Projektmanagement (K1), TQ.21.03 Objektmanagement (K3))
Kreditbegehren, Auftragscontrolling & Projektänderungen genehmigen	TQ. 21.00.00.03.04		- Prüfen der Kreditbegehren, Genehmigung und Freigabe durch PFM herbeiführen. - Auftragscontrolling durchführen (Status-berichte, Leistungsprognosen etc. prüfen) - Projektänderungsanträge prüfen und innerhalb der Beauftragung über Freigabe und allfällige Massnahmen entscheiden. - Bei Anträgen ausserhalb der Kompetenz PPE, Genehmigung durch PFM herbeiführen
Phasen-/Auftrags-abschluss prüfen	TQ. 21.00.00.03.05		- Phasenabschlüsse prüfen und innerhalb der Beauftragung über Genehmigung und allfällige Massnahmen entscheiden. Vorlage: TQ.21.04.00.01 F03 Geschäftsblatt Freigabe Realisierung
Folgeauftrag erteilen	TQ. 21.00.00.03.06		Je nach Phasenabschluss: - Nächste Phase freigeben und allfällige Massnahmen festlegen und beauftragen. - Über einen Projektabbruch entscheidet immer das PFM. Ein schriftlicher, formeller Auftrag an den Auftragsnehmern hat immer zu erfolgen, wobei die vorzunehmenden Massnahmen zu benennen sind. Alle informieren. Ausgelöste Prozesse siehe TQ.21.00.00.02 F01 Auftrag Anhang 1 (TQ.21.00 Immobilienmanagement (K0), TQ.21.01 Projektmanagement (K1), TQ.21.03 Objektmanagement (K3))
Auftragsabschluss durchführen	TQ. 21.00.00.03.07		Input aus (TQ.21.00 Immobilienmanagement (K0), TQ.21.01 Projektmanagement (K1), TQ. 21.03 Objektmanagement (K3)) Nach Erhalt des Inbetriebnahmeprotokolls mittels Abrechnungsvorschriften (TQ.21.04.00.02 F04 Abrechnungsvorschriften) Nutzungsbeginn melden. Auswirkungen auf Stammdaten nachführen. Unterzeichnung Geschäftsblatt „Projektabschluss“ durch Antragsteller. Projektinvolvierte beiziehen. Vorlage: TQ.21.04.00.01 F03 Geschäftsblatt Abschluss
Gegebenenfalls Debriefing durchführen	TQ. 21.00.00.03.08		Bei Debriefing formalisiert: Durchführen und Auswertung mit Antrag an Leiter/in Bauten (TQ 21.00.00.03 F01 Debriefing). Entscheid durchführen formalisiertes Debriefing: Bei allen A-Geschäften und andere situativ. Alle beiziehen.

Abkürzungen und Begriffe

- PFM = Portfoliomanager/in
- PPE = Programm- und Projektentwickler/in

Beziehungen zu anderen Prozessen

Informationen / Aktivitäten	Prozess
Auftrag aus Prozess	TQ.21.00.00.02 Machbarkeit Projektdefinition
Input aus Prozess	TQ 21.00 Immobilienmanagement, TQ 21.01 Projektmanagement, TQ 21.03 Objektmanagement
Auftrag an Prozess	TQ 21.00 Immobilienmanagement, TQ 21.01 Projektmanagement, TQ 21.03 Objektmanagement
Auftragskopie an	TQ.21.03.03.50 Umsetzung Unterhalt und Kleinprojekte
Projektabschluss aus	TQ 21.00 Immobilienmanagement, TQ 21.01 Projektmanagement, TQ 21.03 Objektmanagement

Änderungsverzeichnis

Version	Veröffentlicht	Geändert von	Kommentar
AKTUELL (v. 54)	**04.07.2024 09:53**	Künzli Rolf BBL	
v. 53	20.12.2023 15:42	Portmann Thomas BBL	
v. 52	18.12.2023 14:13	Portmann Thomas BBL	
v. 51	18.12.2023 14:11	Portmann Thomas BBL	
v. 50	18.12.2023 13:40	Portmann Thomas BBL	

Zum Seitenverlauf wechseln
